

Sistema de Gestión de Obras - SISGEOB -

MANUAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS Versión 2.0 – junio de 2021

Módulo de seguimiento



**POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS**



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Índice

Introducción	3
Funcionamiento general.....	4
I. Contenedor datos de la licitación	13
II. Contenedor inicio de obras	16
III. Contenedor avances de la obra	20
IV. Contenedor información de estados de pago	24
V. Contenedor Otros Datos A Registrar	32
VI. Contenedor Modificaciones del contrato	35
VII. Contenedor Fin de la obra	44



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

INTRODUCCIÓN

En el contexto de la implementación del Portal GEO-CGR, Control Ciudadano de Obras¹, herramienta que entrega antecedentes relativos a la inversión en obras públicas, se encuentra operativo el Sistema de Gestión de Obras, SISGEOB, el cual contiene la data que se disponibiliza en el precitado portal. Estos antecedentes corresponden a información específica sobre los contratos de obras, identificados como tales en los llamados a licitación pública, privada o trato directo, datos que son incorporados a través de la integración con la información que mantiene Mercado Público y su posterior actualización en el SISGEOB.

Para la implementación definitiva del sistema, se estimó necesario impartir determinadas instrucciones en materia de información de contratos de obra pública, las que se establecieron mediante las resoluciones exentas N° 6.826/2014 y N° 1992/2021, de la Contraloría General de la República.

En consideración a lo anterior y atendida la necesidad de disponer de información oportuna, resulta necesario aumentar la frecuencia y facilitar la actualización de los datos, por lo que se habilitó el nuevo módulo SISGEOB, que permite a las entidades ingresar de manera más ágil la información relativa a las obras en desarrollo.

El presente manual es una guía de apoyo para las entidades públicas que se rigen por la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios que, por tal motivo son usuarias de la plataforma Mercado Público en la que efectúan o publican su proceso de adquisición o contratación de obras, cuyo objetivo es describir paso a paso cómo debe ingresarse la información necesaria al mencionado módulo SISGEOB.

El contenido de este manual se organiza siguiendo la estructura del sistema informático, el cual se compone de distintos contenedores digitales para el registro de información. De esta manera, comienza con un capítulo de funcionamiento general y posteriormente, se desarrollan capítulos para cada uno de los aludidos contenedores.

El presente manual reemplaza íntegramente a su versión anterior.


¹ disponible en www.contraloria.cl/geocgr



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

FUNCIONAMIENTO GENERAL


El sistema SISGEOB se estructura en torno a 3 pasos generales:

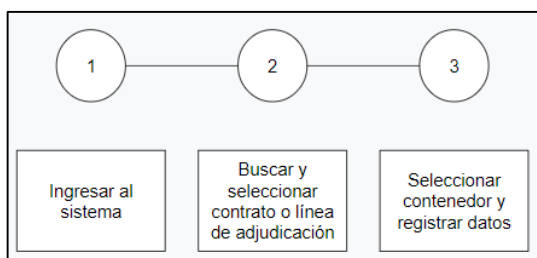

1. Ingresar al sistema

Para ingresar al Sistema, Ud. debe contar con un nombre de usuario y contraseña. En caso de no contar con ellos, puede solicitarlos al correo mesadeayuda@contraloria.cl.

El acceso al Sistema se realiza a través de la url: www.contraloria.cl. Al acceder a este sitio debe buscar la sección “Funcionarios Públicos”, tal como se muestra en la siguiente imagen:





POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Luego, seleccionar la sección “Sistemas Mi CGR”, tal como se muestra en la siguiente imagen:



Una vez dentro, se le solicitarán los datos de usuario y clave. Se recomienda ingresar manualmente la credencial enviada en los campos que muestra la imagen siguiente:



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Al ingresar, tendrá la opción (destacada en color rojo) de cambiar la contraseña asignada, o de ingresar directamente a la plataforma de registro (destacada en color amarillo), tal como se puede observar en la siguiente imagen:



Al acceder a la plataforma SISGEOB, se abrirá la bandeja de contratos asociada a su entidad pública, como muestra la siguiente imagen:

SISGEOB

SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS

Buscar (Nombre o ID)

SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS

38 REGISTROS

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: Todas - 38 Registros.

Contratos en ejecución

Contratos Finalizados

ID Mercado Público	Nombre de la Licitación	Monto Actual	Fecha de adjudicación	Fecha de término	Estado	Fecha última actualización	Acciones
☐ 612-46-LE19	REPOSICIÓN CUBIERTA Y PATIO TECHADO ESC. II PRIETO	\$30.000.000	20/11/2019	20/11/2021	Adjudicada	20/11/2019	
☐ 3621-4-LE17	MEJORAMIENTO A. VERDES AV. HUMERES T. DOMEYKO - ERRAZURIZ	\$6.383.710	03/04/2017	-	Adjudicada	03/04/2017	
☐ 3621-102-LE16	CONST. ESPACIO SOCIO-DEPORTIVO S. LAURA LOS MOLINOS	\$21.483.121	03/03/2017	-	Adjudicada	03/03/2017	
☐ 3621-106-LE16	MEJORAMIENTO ESCUELA ALICAHUE	\$11.368.534	20/02/2017	02/05/2017	En Construcción	08/05/2017	
☐ 3621-105-LE16	REPOSICION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ESCUELA LAS PUE	\$9.553.541	20/02/2017	-	Adjudicada	20/02/2017	
☐ 3621-84-LE16	MEJORAMIENTO A. VERDES AV. HUMERES T. DOMEYKO - ERRAZURIZ	\$-1	-	-	Por Adjudicar	14/12/2016	
☐ 3621-82-LE16	MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DIVERSAS ESCUELA DE LA COMUNA	\$28.814.185	14/12/2016	-	Adjudicada	14/12/2016	
☐ 3621-81-LE16	CONST. RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD ETAPA II	\$5.459.125	16/11/2016	23/12/2016	En Construcción	24/05/2017	
☐ 3621-61-LQ16	Reposicion de Cubiertas Diversas escuelas de la co	\$117.673.730	10/11/2016	19/06/2017	En Construcción	18/05/2017	
☐ 3621-78-LE16	AMPLIACION OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS	\$-1	-	-	Por Adjudicar	08/11/2016	

Registros totales: 38

Remitr información a Contraloría General

«

1

2

3

»

Una vez allí, debe revisar que los proyectos correspondan a su entidad. En caso contrario, o si falta incorporar licitaciones o tratos directos, debe contactarse con la Mesa de Ayuda de Contraloría, mesadeayuda@contraloria.cl



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

2. Buscar y seleccionar contrato o línea de adjudicación

El sistema permite 4 maneras de buscar un contrato o línea de adjudicación. La primera es buscar directamente en el listado de la bandeja de contratos. Considere que las columnas pueden ordenarse en orden ascendente/descendente. En caso de que existan más de 10 registros, se podrá consultar en otras páginas del listado, según se indica en la siguiente imagen:

SISGEOB SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS

Buscar (Nombre o ID)

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: Todas - 38 Registros.

Contratos en ejecución Contratos finalizados

ID Mercado Público	Nombre de la Licitación	Monto Actual	Fecha de adjudicación	Fecha de término	Estado	Fecha última actualización	Acciones
812-46-LE19	REPOSICIÓN CUBIERTA Y PATIO TECHADO ESC. JJ PRIETO	\$30.000.000	20/11/2019	20/11/2021	Adjudicada	20/11/2019	
3621-4-LE17	MEJORAMIENTO A. VERDES AV. HUMERES T. DOMEYKO - ERRAZURIZ	\$8.383.710	03/04/2017	-	Adjudicada	03/04/2017	
3621-102-LE16	CONST. ESPACIO SOCIO-DEPORTIVO S. LAURA LOS MOLINOS	\$21.483.121	03/03/2017	-	Adjudicada	03/03/2017	
3621-106-LE16	MEJORAMIENTO ESCUELA ALICAHUE	\$11.368.534	20/02/2017	02/05/2017	En Construcción	08/05/2017	
3621-105-LE16	REPOSICION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ESCUELA LAS PUE	\$9.553.541	20/02/2017	-	Adjudicada	20/02/2017	
3621-84-LE16	MEJORAMIENTO A. VERDES AV. HUMERES T. DOMEYKO - ERRAZURIZ	\$-1	-	-	Por Adjudicar	14/12/2016	
3621-82-LE16	MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DIVERSAS ESCUELA DE LA COMUNA	\$28.814.185	14/12/2016	-	Adjudicada	14/12/2016	
3621-81-LE16	CONST. RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD ETAPA II	\$5.459.125	16/11/2016	23/12/2016	En Construcción	24/05/2017	
3621-61-LQ16	Reposicion de Cubiertas Diversas escuelas de la co	\$117.673.730	10/11/2016	19/06/2017	En Construcción	18/05/2017	
3621-78-LE16	AMPLIACION OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS	\$-1	-	-	Por Adjudicar	08/11/2016	

Registros totales: 38

Remitir información a Contraloría General

2

Donde:

1. Permite ordenar columnas en orden ascendente/descendente.
2. Permite consultar otras páginas del listado de registros.

La segunda manera de buscar un contrato es mediante la función “Filtrar por”. Para acceder a esta función haga click en “filtrar por” como se ve en la siguiente imagen:

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: Todas - 38 Registros.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Este botón entrega la opción de filtrado por Estado y Fecha. Si se elige la opción por Estado, se puede filtrar por todas las obras, “Adjudicadas”, “En construcción” y “Finalizadas”, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: Todas - 38 Registros.

Estado: Todas, Adjudicada, En construcción, Finalizada

Fecha: [] 3621-28-1 [] ACTUALIZACION PL

Si se elige la opción por fecha, el usuario puede seleccionar el rango de fechas entre las que desea buscar una obra, utilizando el calendario de despliegue automático, tal como se aprecia en la siguiente imagen:

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: 38 Registros.

dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa Filtrar Limpiar Cerrar

La tercera manera de buscar un contrato es haciendo clic en el botón “Contratos en ejecución” o en “Contratos Finalizados” ubicados en la parte superior derecha de la pantalla, marcándose de color verde el botón seleccionado, desplegándose las obras que cumplen con tales características, como se muestra a continuación:

SISGEOB SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS

Buscar (Nombre o ID)

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: 38 Registros.

dd-mm-aaaa dd-mm-aaaa Filtrar Limpiar Cerrar

Contratos en ejecución Contratos finalizados

ID Mercado Público	Nombre de la Licitación	Monto Actual	Fecha de adjudicación	Fecha de término	Estado	Fecha última actualización	Acciones
☐ 3621-28-LQ16	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, CABILDO	\$137.965.000	17/06/2016	-	Adjudicada	17/06/2016	
☐ 3621-78-LE16	AMPLIACION OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS	\$-1	-	-	Por Adjudicar	08/11/2016	
☐ 3621-199-LP14	REPOSICION VEREDAS CENTRO CIVICO	\$42.438.339	12/02/2015	21/04/2015	En Construcción	16/05/2017	
☐ 3621-77-LP15	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO Y DER. LA RINCONADA	\$55.813.721	08/07/2015	24/11/2015	En Construcción	24/05/2017	



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Por último, la cuarta manera de buscar un contrato es mediante la barra de búsqueda que se encuentra al centro de la parte superior de la pantalla, donde el usuario puede completar datos asociados a cada uno de los campos que contempla la bandeja de contratos, tal como muestra la siguiente imagen:

SISGEOB SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS

1. Buscar (Nombre o ID)...

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: Todas - 38 Registros. 2.

Contratos en ejecución | Contratos finalizados

ID Mercado Público	Nombre de la Licitación	Monto Actual	Fecha de adjudicación	Fecha de término	Estado	Fecha última actualización	Acciones
☐ 3621-28-LQ16	ACTUALIZACION PLAN REGULADOR COMUNAL, CABILDO	\$137.965.000	17/06/2016	-	Adjudicada	17/06/2016	
☐ 3621-78-LE16	AMPLIACION OFICINAS SERVICIOS PUBLICOS	\$-1	-	-	Por Adjudicar	08/11/2016	
☐ 3621-199-LP14	REPOSICION VEREDAS CENTRO CIVICO	\$42.438.339	12/02/2015	21/04/2015	En Construccion	16/05/2017	
☐ 3621-77-LP15	MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO Y DEP. LA RINCONADA	\$55.813.721	08/07/2015	24/11/2015	En Construccion	24/05/2017	
☐ 3621-100-LP15	CONST. MUROS Y CANCHA PASTO SINTETICO, EL ARRAVÁN	\$74.866.254	09/09/2015	06/01/2016	En Construccion	02/03/2017	
☐ 3621-121-LE15	DISEÑO Y CONSTRUCCION PISCINA PARQUE MUNICIPAL	\$50.559.831	23/10/2015	-	En Construccion	24/05/2017	
☐ 3621-113-LE15	DISEÑO PAVIMENTOS PPP DIVERSAS CALLES Y PASAJES DE	\$13.000.000	28/10/2015	-	Adjudicada	28/10/2015	

Donde:

1. Permite ingresar datos de contratos que estén contenidos en 2.
2. Campos de la bandeja de contratos en los que se muestra información de aquellos.

En caso de no existir coincidencias se mostrará el mensaje “No se encuentran resultados de obras para la búsqueda especificada.” como muestra la imagen que sigue. Para realizar una nueva búsqueda vuelva a hacer clic en el botón “Filtrar por”, enseguida “Estado” y luego “Todas”. En caso de que existan resultados, estos se desplegarán.

SISGEOB SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS

Buscar (Nombre o ID)...

BANDEJA DE CONTRATOS

Filtrar por: Finalizada - 0 Registros.

Contratos en ejecución | Contratos finalizados

ID Mercado Público	Nombre de la Licitación	Monto Actual	Fecha de adjudicación	Fecha de término	Estado	Fecha última actualización	Acciones
No se encuentran resultados de obras para la búsqueda especificada.							



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Una vez que haya encontrado el registro de su interés, haga clic sobre el cuadro que está a la izquierda del registro para seleccionarlo, en este mismo apartado usted también podrá visualizar los datos ya ingresados de la obra haciendo “clic” en el icono simbolizado con un ojo. Por su parte, el icono del lápiz permite al usuario editar la información de la obra. El cuadro de la fila seleccionada se resaltará en color negro (ver imagen a continuación) y Ud. estará en condiciones para continuar con el paso 3.

SISGEOB SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS							
BANDEJA DE CONTRATOS							
Filtrar por: Todas - 38 Registros.							
ID Mercado Público	Nombre de la Licitación	Monto Actual	Fecha de adjudicación	Fecha de término	Estado	Fecha última actualización	Acciones
☐ 3621-81-LE16	CONST. RESALTOS REDUCTORES DE VELOCIDAD ETAPA II	\$5.459.125	16/11/2016	23/12/2016	En Construcción	24/05/2017	 
☐ 3621-82-LE16	MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO DIVERSAS ESCUELA DE LA COMUNA	\$28.814.185	14/12/2016	-	Adjudicada	14/12/2016	 
☒ 3621-106-LE16	MEJORAMIENTO ESCUELA ALICAHUE	\$11.368.534	20/02/2017	02/05/2017	En Construcción	08/05/2017	 
☐ 3621-105-LE16	REPOSICION CUBIERTA Y MEJORAMIENTO ESCUELA LAS PUE	\$9.553.541	20/02/2017	-	Adjudicada	20/02/2017	 
☐ 3621-102-LE16	CONST. ESPACIO SOCIO-DEPORTIVO S. LAURA LOS MOLINOS	\$21.483.121	03/03/2017	-	Adjudicada	03/03/2017	 
☐ 3621-4-LE17	MEJORAMIENTO A. VERDES AV. HUMERES T. DOMEYKO - ERRAZURIZ	\$8.383.710	03/04/2017	-	Adjudicada	03/04/2017	 
☐ 3621-84-LE16	MEJORAMIENTO A. VERDES AV. HUMERES T. DOMEYKO - ERRAZURIZ	\$-1	-	-	Por Adjudicar	14/12/2016	
☐ 812-46-LE19	REPOSICIÓN CUBIERTA Y PATIO TECHADO ESC. JJ PRIETO	\$30.000.000	20/11/2019	20/11/2021	Adjudicada	20/11/2019	 

3. Seleccionar contenedor y registrar datos

El registro de datos en el Sistema se realiza en 6 contenedores, a los que se añade otro que permite la consulta de datos denominado “Datos de la licitación”. El acceso a estos contenedores se efectúa haciendo clic en los respectivos íconos desplegados abajo de “Detalle del contrato”, tal como se observa en la siguiente imagen:

SISGEOB SISTEMA GESTIÓN DE OBRAS	
DETALLE DEL CONTRATO	
MEJORAMIENTO ESCUELA ALICAHUE, 3621-106-LE16	
Datos de la licitación	+
Inicio de obras	+
Avances de la obra	+
Información de estados de pago	+
Otros Datos A Registrar	+
Modificaciones del contrato	+
Fin de la obra	+
Finalizar registro	
Volver a la bandeja de contratos	



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

La función de cada contenedor es la siguiente:

Nombre contenedor	Función
Datos de la licitación	Consultar datos
Inicio de obras	Registrar datos
Avances de la obra	Registrar datos
Información de estados de pago	Registrar datos
Otros Datos A Registrar	Registrar datos
Modificaciones del contrato	Registrar datos
Fin de la obra	Registrar datos

El acceso a los contenedores dependerá del estado en el que se encuentre el registro seleccionado. Los contenedores habilitados para cada estado y los eventos que activan el cambio de estado se describen a continuación, indicando las acciones que pueden realizarse en ellos:





POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

* Sólo habrá cambio de estado cuando se den las siguientes combinaciones:

- Recepción total + única
- Recepción total + provisoria
- Recepción Parcial + Provisoria (con marca checkbox que indica que se está recepcionando la última etapa de obra).

Se recomienda que el registro de información en la plataforma se realice de forma oportuna, a medida que avance la ejecución del contrato, a fin de llevar un registro actualizado y ajustado a la realidad. La plataforma se encuentra operativa para ser consultada en cualquier momento y desde cualquier equipo.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

I. Contenedor datos de la licitación

El contenedor posee información básica sobre el procedimiento de contratación registrado, que proviene de Mercado Público y es incorporada automáticamente por el sistema.

En particular, este contenedor proporciona datos relativos al acto de adjudicación y a la información que el usuario ingresa en el módulo inicial de SISGEOB que está disponible en la integración, que se despliega en el portal de compras públicas, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Datos de la licitación			
Monto adjudicado	\$9.553.390	Empresa contratista	WLADIMIR GERMAN CARRENO CORTES -
RUT contratista	13.750.891-5	Fecha de inicio	27/02/2017
Fecha de término	10/04/2017	Plazo de ejecución	42 días corridos.

Monto adjudicado		
Descripción	Acciones del usuario	Opciones / Ejemplo
Corresponde al monto unitario de la oferta que se adjudica la licitación o al monto de la orden de compra asociada al trato directo.	No se completa. El usuario solo puede visualizar la información. Dato proveniente de la Plataforma de Mercado Público, en caso que se haya adjudicado en pesos chilenos; en caso contrario, desde el módulo inicial de SISGEOB (el usuario debe indicar el monto transformado a pesos).	Pesos chilenos \$ 9.553.390



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Empresa contratista		
Descripción	Acciones del usuario	Opciones / Ejemplo
Identificación de la persona natural o jurídica que, en virtud del contrato, contrae la obligación de ejecutar una obra, por alguna de las modalidades contempladas en las bases.	No se completa. El usuario solo puede visualizar la información. Dato proveniente de la Plataforma de Mercado Público.	Wladimir Germán Carreño Cortés

RUT contratista		
Descripción	Acciones del usuario	Opciones / Ejemplo
Rol Único Tributario de la persona natural o jurídica que se adjudica la licitación	No se completa. El usuario solo puede visualizar la información. Dato proveniente de la Plataforma de Mercado Público.	13.750.891-5

1.4 Fecha de inicio		
Descripción	Acciones del usuario	Opciones / Ejemplo
Fecha inicio estimada en la que el servicio tiene previsto que el contratista inicie la ejecución de las obras	No se completa. El usuario solo puede visualizar la información. Dato proveniente desde el módulo inicial de SISGEOB en la Plataforma de Mercado Público.	27/02/2017



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

1.5 Fecha de término

Descripción	Sistema de origen	Opciones / Ejemplo
Fecha de término estimada en la que el servicio tiene previsto que el contratista finalice la ejecución de las obras	No se completa. El usuario solo puede visualizar la información. Dato proveniente desde el módulo inicial de SISGEOB en la Plataforma de Mercado Público.	10/04/2017

1.6 Plazo de ejecución

Descripción	Sistema de origen	Opciones / Ejemplo
Período de tiempo en el que se estima, se ejecutará la obra.	No se completa. El usuario solo puede visualizar la información. Dato proveniente desde la Plataforma de Mercado Público	Días corridos



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

II. Contenedor inicio de obras

Este contenedor permite registrar información sobre el inicio efectivo de las obras, además de actualizar la fecha estimada de término, ingresada en el módulo inicial de SISGEOB disponible en la Plataforma de Mercado Público. Adicionalmente, se debe identificar al inspector de obras del contrato, a través de la interoperabilidad con el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER) que mantiene esta Contraloría General. Se debe tener presente que, en este contenedor, todos los campos requeridos son obligatorios. Además, al registrar datos se habilita la posibilidad de ingresar información en los demás contenedores, por lo que, hasta que no se registre la información necesaria, no se podrá acceder al registro en los siguientes.

Vista general del contenedor.

Inicio de obras			
Fecha real inicio	dd-mm-aaaa	Fecha Estimada Termina	dd-mm-aaaa
Monto contratado	0	Rut inspector de obras	-
Primer nombre		Segundo nombre	
Apellido paterno		Apellido materno	
Guardar		Finalizar Registro	

Fecha real inicio		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
Fecha en que efectivamente se iniciaron los trabajos contratados, de este hecho se dejará constancia en el libro de obras respectivo.	Seleccionar fecha desde el calendario de despliegue automático, esta fecha no podrá ser anterior a la fecha de inicio que proviene de la Plataforma de Mercado Público, ni a la fecha de adjudicación en el sistema.	22/03/2017



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Fecha estimada término		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
Fecha en que el servicio tiene previsto que el contratista ponga término a la ejecución de las obras.	Seleccionar fecha desde el calendario de despliegue automático.	02/05/2017

Monto contratado		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
Valor total del contrato, correspondiente al precio – conformado por el costo directo, gastos generales y utilidades – más el impuesto al valor agregado (IVA) y valores pro forma, si los hubiere.	Ingresar el monto total del contrato. Este monto deberá reflejarse en la bandeja de contratos, reemplazando al monto adjudicado.	\$11.368.534

Rut Inspector de obras		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
RUT del profesional competente, independiente del constructor, que fiscaliza que las obras se ejecuten conforme a las normas de construcción que le sean aplicables y al permiso de construcción aprobado.	Ingresar el Rut del inspector de obras.	RUT de quien desempeña esa labor.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Primer nombre		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
Primer nombre del profesional que ejercerá como inspector de obras.	Automático al buscar en SIAPER.	Primer nombre

Segundo Nombre		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
Segundo nombre del profesional que ejercerá como inspector de obras.	Automático al buscar en SIAPER.	Segundo nombre

Apellido Paterno		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
Apellido paterno del profesional que ejercerá como inspector de obras.	Automático al buscar en SIAPER.	Apellido paterno

Apellido materno		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Empleo
Apellido materno del profesional que ejercerá como inspector de obras.	Automático al buscar en SIAPER.	Apellido materno



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Al ingresar el RUT del inspector de obras y presionar “Buscar inspector en SIAPER”, se autocompletarán los campos que siguen al texto “Nombre y apellidos” (primer nombre, segundo nombre, primer apellido y segundo apellido), tal como se muestra en las siguientes imágenes:

Fecha real inicio	22-03-2017	Fecha Estimada Termino	02-05-2017
Monto contratado	\$11.368.534	Rut inspector de obras	13054312 [Buscar en SIAPER]
Primer nombre		Segundo nombre	
Apellido paterno		Apellido materno	
[Guardar]		[Finalizar Registro]	

Fecha real inicio	22 - 03 - 2017	Fecha Estimada Termino	02 - 05 - 2017
Monto contratado	\$11.368.534	Rut inspector de obras	13054312 [k] [Buscar en SIAPER]
Primer nombre	CRISTIAN	Segundo nombre	ALBERTO
Apellido paterno	CAMPOS	Apellido materno	ALIAGA
[Guardar]		[Finalizar Registro]	

Para completar el registro, existen dos botones de acción: “Guardar” y “Finalizar Registro”. La opción “Guardar” permite mantener un borrador sujeto a modificaciones posteriores de los datos del contenedor, mientras que la opción “Finalizar Registro” corresponde al envío definitivo de la información registrada en el contenedor a esta Contraloría General, sin posibilidad de una posterior modificación².

² Excepcionalmente, en caso de necesitar modificar la información, debe contactar a la Mesa de Ayuda de Contraloría



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

III. Contenedor avances de la obra

El contenedor permite registrar información sobre los avances físicos que se realicen durante la ejecución de las obras. Todos los datos requeridos son de carácter obligatorio. Cuando no se han ingresado avances, el contenedor se visualiza de la siguiente manera, incorporando el texto “No se encuentran resultados”, tal cual muestra la siguiente imagen:

Porcentaje de avance físico		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Porcentaje de avance en la ejecución de la obra en relación al total requerido para su término.	Ingresar el número que corresponda al porcentaje de avance físico.	90%

Fecha del avance		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha correspondiente a la ejecución del avance físico registrado.	Seleccionar fecha desde el calendario de despliegue automático. Esta fecha no debe ser anterior a la fecha de adjudicación ni a la fecha real de inicio de las obras ni a los registros anteriores.	14/06/2017



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Los registros de avance físico deben realizarse, en lo posible, mes a mes, en relación a los compromisos y plazos de cada contrato. El contenedor mostrará un registro histórico de los avances ingresados. Cuando se ha ingresado la información del primer avance físico, este se visualiza como se muestra en la siguiente imagen:

Avances de la obra

Porcentaje de avance físico: Fecha del avance:

N° Avance	Fecha	% Avance acumulado	Acciones
2	02/02/2017	60	
1	02/01/2017	20	

Registros totales: 2

Cabe precisar que, en la imagen anterior hay un apartado denominado “Acciones” en el que se encuentran disponibles dos botones, uno de edición y otro para eliminar, los que sólo podrán operarse en la medida que no se haya finalizado el registro, ya que luego de confirmar el envío de los datos, no es posible editar/eliminar la información ingresada previamente.

Avances de la obra

Porcentaje de avance físico: Fecha del avance:

Advertencia

Usted ha ingresado un avance acumulado menor al último porcentaje registrado. ¿desea continuar?

N° Avance	Fecha	% Avance acumulado	Acciones
2	02/02/20		
1	02/01/20		

Registros totales: 2

Como se observa en la imagen anterior, a la tabla resumen del primer avance físico registrado, se incorporó un mensaje de advertencia que no se encontraba disponible en la pantalla inicial del contenedor, señalando que se ha ingresado un avance acumulado menor al último porcentaje registrado, esto se debe a que el registro de avance físico es de carácter acumulativo, es decir, que el porcentaje ingresado en cada oportunidad acumula los avances anteriores, y no procede registrar un porcentaje parcial de lo ejecutado en cada caso.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Si se desea continuar y se da clic en el botón “Aceptar”, el sistema despliega un mensaje de advertencia en el centro, como se muestra en la siguiente imagen:

Si se da clic en el botón “Aceptar”, el sistema despliega un espacio llamado “Observaciones” para explicar el menor porcentaje de avance físico. Entre los motivos que pueden justificar esta disminución se encuentra, por ejemplo, el aumento de obras luego de haber realizado el primer avance, por lo que la ejecución de las partidas se recalcula y puede, eventualmente, representar un porcentaje menor al registrado en el primer avance. El recuadro habilitado para registrar las observaciones aparece destacado en la siguiente imagen:

Observaciones		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Motivo que explica el registro de un avance físico inferior al registrado previamente.	Ingresar texto libre con un máximo de 4.000 caracteres. Campo obligatorio si el porcentaje es inferior al registrado previamente.	“Avance físico inferior debido a aumento de obras”.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Luego de haber registrado el motivo de la disminución en un avance posterior, el nuevo registro se visualiza en la tabla resumen que va mostrando todos los avances físicos registrados durante la ejecución de las obras. De esta manera, el porcentaje de avance acumulado de la obra corresponderá al último avance declarado. Para poder liquidar una obra es necesario que el porcentaje de avance no sea inferior a 100%. La tabla resumen se mostrará como se ve en la siguiente imagen:

N° Avance	Fecha	% Avance acumulado	Acciones
3	16/02/2017	30	 
2	02/02/2017	60	
1	02/01/2017	20	

Registros totales: 3

Finalizar Registro

Sólo se podrá editar la información del último avance registrado para no afectar los cálculos del sistema. La opción “Finalizar Registro” corresponde al envío definitivo de la información expuesta en el contenedor a esta Contraloría General, sin posibilidad de modificación³.

El sistema validará que el porcentaje de avance físico ingresado no supere el 100%, por lo que, en caso de ingreso de un porcentaje mayor al indicado, se desplegará el siguiente mensaje de advertencia, debiendo rectificarse la cifra:

Avances de la obra

Porcentaje de avance físico

101

El valor del porcentaje debe estar entre 0 y 100.

³ Excepcionalmente, en caso de necesitar modificar la información, debe contactar a la Mesa de Ayuda de Contraloría



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

IV. Contenedor información de estados de pago

Este contenedor permite registrar información sobre los avances financieros que se realicen durante la ejecución de la obra. Los avances financieros se materializan mediante los estados de pago. En caso de no existir registros de estados de pago, el contenedor indicará que “No se encuentran resultados”, como muestra la siguiente imagen:

N° EP	Fecha	Monto estado de pago	% Avance	Acciones
No se encuentran resultados.				

Agregar nuevo estado Pago

Finalizar Registro

Para ingresar un nuevo estado de pago se debe hacer click sobre el botón “Agregar nuevo estado Pago”, y se abrirá una ventana emergente que en ningún caso será mayor que la ventana actual, superponiéndose al contenido tal como puede verse en la siguiente imagen:

Registrar nuevo estado de pago

N° de estado de pago: 3 Anticipos: 0

Tipo de estado de pago: Ordinario Retenciones: 0

Fecha del estado de pago: 16/02/2017 Multas: 0

Monto ejecutado en el periodo: \$17.599.880 Valores proforma: 0

Monto total del estado de pago: \$17.599.880

Ingresar Registro

Acciones: [Iconos] << < 1 > >> **Agregar nuevo estado Pago**



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Número de estado de pago		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Número asociado al estado de pago que se está registrando	Manual.	3

Tipo estado de pago		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Esta opción permite indicar por qué concepto se está emitiendo el estado de pago ("ordinario"-avance de las obras contratadas-, "por reajuste"-solo paga los reajustes del contrato-, "extraordinario"-paga aparte las obras nuevas o extraordinarias-, "otros"). En caso que la entidad no realice diferenciación y registre todos los conceptos en un solo estado de pago (incluyendo reajustes, modificaciones de obra, valores proforma, entre otros) se debe seleccionar la opción "ordinario".	Manual. Selección múltiple	▪ Ordinario ▪ Por reajuste ▪ Extraordinario ▪ Otro



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Fecha del estado de pago		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha en que se aprueba el avance financiero registrado.	Seleccionar la fecha desde el calendario de despliegue automático, no debe ser anterior a la fecha de adjudicación, ni a la fecha de inicio real.	13/04/2017

Monto ejecutado en el periodo		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra en pesos chilenos correspondiente al avance pagado del contrato.	Ingresar un monto.	\$11.368.534

Anticipos		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Adelanto o avance del precio del contrato destinado a apalancar el cumplimiento de su objeto	Manual.	\$1.134.567

Retenciones		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Monto que se retiene al contratista para asegurar el cumplimiento de la obra.	Manual.	\$1.056.770



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Multas		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Monto con que se sanciona al contratista por contravenir alguna norma que rige la materia o lo indicado en el contrato	Manual.	\$250.000

Valores proforma		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Campo que da cuenta de diferencias en alguna partida subcontratada entre el monto efectivamente pagado por el contratista debidamente acreditado para su reembolso, el cual puede diferir del monto contemplado al momento de contratar	Manual.	\$34.671

Monto total del estado de pago		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Corresponde a la sumatoria ejecutada por el sistema en base a los datos registrados anteriormente	Automático	\$145.667.894



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Los registros de avance financiero deben realizarse, en lo posible, mes a mes, en relación a los compromisos y plazos definidos en cada contrato. Cuando se ha ingresado la información de los estados de pago, se visualiza tal como se muestra en la siguiente imagen:

N° EP	Fecha	Monto estado de pago	% Avance	Acciones
3	16/02/2017	\$17.599.880	25,88	 
2	02/02/2017	\$20.000.000	29,41	
1	02/01/2017	\$30.000.000	44,12	

Registros totales: 3

Total pagado a la fecha: \$67.599.880

Porcentaje de avance financiero: 99,41 %

[Finalizar Registro](#)

[Agregar nuevo estado Pago](#)

Número de estado de pago		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Número asociado al estado de pago que se está registrando	Manual.	2

Fecha		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha en que se aprueba el avance financiero registrado.	Seleccionar la fecha desde el calendario de despliegue automático, no debe ser anterior a la fecha de adjudicación, ni a la fecha de inicio real.	13/04/2017



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Monto estado de pago		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra en pesos chilenos correspondiente al avance pagado del contrato.	Ingresar un monto	\$11.368.534

% de avance		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Porcentaje que representa el monto del avance ingresado, sobre el monto total del contrato.	No se completa. El usuario solo puede visualizar la información. Dato calculado a partir del monto de avance registrado.	100%

Porcentaje de avance financiero		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Porcentaje correspondiente al monto total pagado a la fecha.	Automático. No debe superar el monto vigente contemplado para la obra	80%

Total pagado a la fecha		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Monto total acumulado en pesos chilenos a la fecha, que incluye la sumatoria de los estados de pago	Automático	\$1.568.987



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

En la sección de opciones el usuario podrá editar o eliminar la última información registrada. La opción “Finalizar Registro” corresponde al envío definitivo de la información registrada en el contenedor a esta Contraloría General, sin posibilidad de modificación.

En caso de ingresar un porcentaje de avance superior al monto total del contrato, el sistema arroja el siguiente mensaje de advertencia:

El monto total ingresado supera al monto contratado.

En el caso en que no existan errores en cuanto al monto de los avances registrados, y la sumatoria de ellos exceda el 100%, se deben realizar las siguientes verificaciones:

1. Revisar si el campo “Total monto contratado” corresponde a un monto neto o con IVA, de acuerdo a la información extraída desde la Plataforma de Mercado Público. Es preciso indicar que, si no se han efectuado modificaciones de obra en el contenedor “Modificaciones del contrato”, este monto corresponderá al “Monto total adjudicado” obtenido del portal Mercado Público como muestra la siguiente imagen extraída de dicha plataforma:

Resultado de la Adjudicación					
1	Clasificación ONU : 72131702	Construcción de obras civiles			
	Especificaciones del Comprador :	se consulta el cambio de la cubierta y el mejoramiento de la estructura pasillo y pavimento del patio cubierto o porch.			
	Cantidad : 1				
Proveedor		Especificaciones del Proveedor	Monto Unitario Oferta	Cantidad Adjudicada	Total Neto Adjudicado
7.940.341-5 DOMINGO ENRIQUE PEREZ SILVA		MEJORAMIENTO ESC. ALICAHUE	\$ 9986000	0	0
13.750.891-5 WLADIMIR GERMAN CARRENO CORTES		se adjuntan doc. anexos y oferta economica	\$ 9553390	1	9553390
Total Línea					\$ 9.553.390
Monto Total Adjudicado					\$ 9.553.390

2. Revisar el acto administrativo que adjudica o contrata, para verificar si es que no se han incorporado otros factores, como los Valores Proforma (en el caso que los hubiere). Como se muestra en la siguiente imagen, correspondiente a un extracto de decreto de adjudicación, el monto total contratado en el módulo de seguimiento (\$11.368.534) coincide con el monto estipulado en el acto administrativo respectivo, por lo que, no resulta necesario realizar cambios en el contenedor “Modificaciones del contrato”.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

DECRETO:

PRIMERO:

Adjudíquese a la Empresa Wladimir Carreño Cortes; Rut 13.750.891-5, domiciliado en Nueva Esperanza N° 22 Cabildo adelante “El Contratista”, para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento Escuela Alicahue”; según licitación Pública ID 3621-106-LE16, por un monto \$ 11.368.534.- (Once millones trescientos sesenta y ocho mil quinientos treinta y cuatro pesos) C/TVA.

Finalmente, y como se indicaba en la presentación de este contenedor, la información ingresada en esta instancia es de vital importancia, ya que se publica directamente en la Ficha de Obra y en el tooltip resumen que se despliega en cada una de las licitaciones en el portal GEOCGR (www.contraloria.cl/geocgr), por lo que su actualización periódica y oportuna le otorga dinamismo a la información disponible en el portal.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

V. Contenedor Otros Datos A Registrar

Este contenedor permite informar el registro de indemnizaciones y paralizaciones de la obra, según las causas que previamente se han establecido en la normativa aplicable al contrato. Los datos de este contenedor no son de carácter obligatorio. En caso de no existir registros de indemnizaciones y paralizaciones de la obra, el contenedor indicará que “No se encuentran resultados”, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Para completar el registro, existen dos botones de acción: “Guardar” y “Finalizar Registro”. La opción “Guardar” permite mantener un borrador sujeto a modificaciones posteriores de los datos del contenedor, mientras que la opción “Finalizar Registro” corresponde al envío definitivo de la información registrada en el contenedor a esta Contraloría General, sin posibilidad de una posterior modificación.

5.1 Indemnizaciones

En este sub contenedor se puede registrar el monto y motivo de la indemnización, según se puede ver en la siguiente imagen:



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Monto indemnización		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra en pesos chilenos correspondiente al resarcimiento pecuniario del daño por una causa establecido en la normativa aplicable al contrato, que procede cuando concurren los supuestos en ella dispuesta.	Ingresar un monto	\$3.000.000

Motivo indemnización		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Motivo por el cual el servicio aprobó la indemnización.	Seleccionar una o más opciones disponibles en la lista desplegable.	▪ Por disminución efectiva del contrato. ▪ Por falta de entrega de terreno por parte del Servicio. ▪ Por mayores gastos generales. ▪ Por paralización de faenas ordenadas por la Dirección. ▪ Por terminación anticipada en caso que la paralización ordenada exceda de dos meses. ▪ Motivos antiguos o que no calzan con los otros.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

5.2 Paralización de la obra

En este sub contenedor se puede registrar si la obra está paralizada (es decir, si no presenta movimientos físicos o financieros durante un periodo determinado) y el motivo de dicha paralización, tal cual muestra la siguiente imagen:

Otros Datos A Registrar

Indemnizaciones

Monto Indemnización: \$3.000.000
Motivo Indemnización: Seleccione una opción

Paralización de la obra

¿La obra esta paralizada?: Seleccione una opción

Seleccoe una opción
Si
No

Motivo Paralización:

¿La obra está paralizada?		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Estado que da cuenta de que la ejecución de las obras se encuentra detenida, sin que presente avances físicos o en terreno	Seleccionar una de las dos opciones de los botones de tipo radio.	- Si - No

Motivo paralización		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Motivo por el cual se paralizó la obra.	Ingresar texto libre con un máximo de 4.000 caracteres.	“La obra se encuentra paralizada por problemas de la empresa contratista”.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

VI. Contenedor Modificaciones del contrato

Este contenedor permite registrar los cambios contractuales relacionados con los siguientes ámbitos de ejecución de la obra:

- Modificaciones del monto de la obra, por concepto de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias.
- Modificaciones de plazo.
- Cambio del contratista.

En el caso de no existir registros de modificaciones en la plataforma el contenedor indicará que “No se ha registrado información sobre modificaciones”, tal como muestra la siguiente imagen:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
----------------------	-------	----------

Finalizar Registro

No se ha registrado información sobre modificaciones.

Para ingresar una modificación en el contrato, se debe hacer click en el botón “Ingresar modificaciones”, el cual, aparece destacado en la imagen a continuación:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
----------------------	-------	----------

Finalizar Registro

No se ha registrado información sobre modificaciones.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

6.1 Tipo de modificación

En este contenedor el usuario puede seleccionar el tipo de modificación de contrato, ya sea por monto, plazo o contratista. Al seleccionar la opción deseada, se habilitará el sub contenedor correspondiente para efectuar el registro de información. El recuadro para seleccionar el tipo de modificación se verá tal cual muestra la siguiente imagen:

6.1.1 Modificación en el monto de la obra

En este sub contenedor se registran los datos sobre los montos de las modificaciones de obras. Una vez que se hayan realizado las modificaciones correspondientes, se debe dar click en el botón “Ingresar”, según muestra la siguiente imagen:



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Monto de aumento		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra en pesos chilenos correspondiente a la modificación que se produce al aumentar las cantidades de obras previstas en el respectivo contrato.	Ingresar un monto	\$10.000.000

Monto de disminución		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra en pesos chilenos correspondiente a la modificación que se produce al disminuir las cantidades de obras previstas en el respectivo contrato.	Ingresar un monto	\$80.000.000

Monto de obras extraordinarias		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Obras que se incorporan o agregan al proyecto para llevar a mejor término la obra contratada, pero cuyas características son diferentes a las especificadas o a las contenidas en los antecedentes que sirven de base al contrato.	Ingresar un monto	\$50.000.000



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Monto total actualizado		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Monto total acumulado en pesos chilenos a la fecha, que incluye la sumatoria de los estados de pago y las modificaciones de monto u obras extraordinarias	Automático	\$6.000.000

Una vez realizado el ingreso, el contenedor muestra un detalle con la modificación de monto realizada, la fecha en que se efectúa y dos acciones disponibles, el botón de edición y el botón de eliminar. Se debe tomar en cuenta que solo es posible editar la modificación registrada hasta antes que se finalice el registro. La siguiente imagen muestra una visualización del contenedor con los elementos mencionados destacados en rojo:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
Monto	20/11/2019	 

Registros totales: 1

Finalizar Registro

Una vez que esté lista la modificación de monto, dar click en el botón “Finalizar Registro” que muestra la imagen a continuación:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
Monto	20/11/2019	 

Registros totales: 1

Finalizar Registro



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

La opción “Finalizar Registro” corresponde al envío definitivo de la información expuesta en el contenedor a esta Contraloría General.

6.1.2 Modificaciones de plazos

En este sub contenedor se puede registrar un aumento o disminución de plazo de ejecución de la obra. Una vez que se hayan realizado las modificaciones correspondientes, se debe dar click en el botón “Ingresar” como muestra la siguiente imagen:

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación: ☐ Monto ☒ Plazo ☐ Contratista

Días corridos de aumento de plazo: 10

Días corridos en que disminuye el plazo:

Plazo total modificado: 55

Nueva fecha de término: 16/05/2017

Ingresar

Días corridos de aumento de plazo		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cantidad de días corridos en que se aumenta la duración de la ejecución de la obra, según el plazo estipulado en el contrato; puede ocurrir por iniciativa del contratista, por fuerza mayor o modificaciones de obra, por reprogramación del servicio.	Ingresar el número de días corridos	10



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Días corridos en que disminuye el plazo		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cantidad de días corridos en que se disminuye la duración de la ejecución de la obra, según el plazo estipulado en el contrato; puede ocurrir por iniciativa del contratista, por fuerza mayor o modificaciones de obra, por reprogramación del servicio.	Ingresar el número de días corridos	3

Nueva fecha de término		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha de término de contrato que considera las variaciones de plazo.	Seleccionar la fecha desde el calendario de despliegue automático.	16/05/2016

Una vez realizado el ingreso, el contenedor muestra un detalle con la modificación de plazo realizada, la fecha en que se efectúa y dos acciones disponibles, el botón de edición y el botón para eliminar, los cuales permiten actualizar la modificación realizada y se pueden visualizar en la imagen a continuación:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
Monto	20/11/2019	 

Registros totales: 1

Finalizar Registro



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Una vez que esté lista la modificación de plazo, dar click en el botón “Finalizar Registro” que muestra la siguiente imagen:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
Plazo	20/11/2019	

Registros totales: 1

Finalizar Registro

La opción “Finalizar Registro” corresponde al envío definitivo de la información expuesta en el contenedor a Esta Contraloría General.

6.1.3 Cambio de contratista

En este sub contenedor se debe informar el cambio de contratista, las opciones a seleccionar se muestran a continuación:

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación: ☐ Monto ☐ Plazo ☒ Contratista

Tipo: ☒ Contratista ☐ Consortio



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Si selecciona cambiar a otro contratista, se debe ingresar el nombre y RUT de la empresa contratista a la cual desea cambiar. Posteriormente, debe validar al nuevo contratista e ingresarlo a la plataforma, tal cual muestra la siguiente imagen:

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación:

☐ Monto

☐ Plazo

☒ Contratista

Tipo:

☒ Contratista

☐ Consorcio

Nombre empresa contratista

TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA

RUT empresa contratista

76079027

-

3

Validar contratista

Ingresar

Nombre empresa contratista		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Corresponde a un cambio de contratista en que las obligaciones y derechos del contrato permanecen iguales. El contratista que asume la continuidad del contrato debe cumplir con los requisitos exigidos en el llamado a licitación y se hace cargo de todas las obligaciones y derechos contraídos por el primitivo contratista, sin exclusiones de ningún tipo.	Ingresar el nombre de la que será la nueva empresa contratista.	TESCON INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

RUT empresa contratista		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Rol Único Tributario de la nueva persona natural o jurídica que se adjudica la licitación	Ingresar el Rut de la que será la nueva empresa contratista.	76079027-3

Una vez realizado el ingreso, el contenedor muestra un detalle con la modificación de plazo realizada, la fecha en que se efectúa y dos acciones disponibles, el botón de edición y el botón para eliminar, los cuales permiten actualizar la modificación realizada y se pueden visualizar en la siguiente imagen:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
Contratista	20/11/2019	 

Registros totales: 1

Finalizar Registro

Una vez que esté lista la modificación de plazo, dar click en el botón “Finalizar Registro” según indica la imagen a continuación:

Modificaciones del contrato

Ingresar modificaciones

Tipo de modificación	Fecha	Acciones
Contratista	20/11/2019	 

Registros totales: 1

Finalizar Registro

Además, es posible agregar en un mismo registro más de un tipo de modificación a la vez. El sistema llevará un registro de las modificaciones efectuadas. Sólo es posible editar la información de la última modificación efectuada. La opción “Finalizar Registro” corresponde al envío definitivo de la información expuesta en el contenedor a esta Contraloría General.



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

VII. Contenedor Fin de la obra

Permite registrar información relacionada con el término anticipado de un contrato, la recepción de la obra y la liquidación del contrato. En el caso de no existir registros de algún tipo, el contenedor indicará que “No se han encontrado resultados”. La siguiente imagen entrega una vista general del contenedor:

Fin de la obra

Término anticipado:

Fecha

dd - mm - aaaa

Causales

☐ Incumplimientos administrativos

☐ Incumplimientos en la ejecución

☐ Situación del contratista

☐ Decisión del servicio

☐ De común acuerdo.

☐ Otras, especificar.

Guardar

Recepción De La Obra

Tipo De Recepción

☐ Total

☐ Parcial (Por Etapas)

Tipo De Recepción	Fecha	¿Tiene Recepción Definitiva?	Acciones
No se han encontrado resultados			

Liquidación Del Contrato:

Fecha

dd - mm - aaaa

Saldo

Seleccione una opción

Monto Del Saldo

Monto Reajustes

Valor Proforma

Seleccione una opción

Monto Proforma

Guardar

Finalizar registro

Volver a la bandeja de contratos



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

7.1 Término anticipado

En este contenedor se registra la fecha en que se dará término anticipado de contrato, junto con las causales que motivan su origen. Una vez que se ingrese la fecha y la causal del término anticipado de contrato, se procede a guardar los cambios. Con este registro, se inhabilitarán los demás campos de información, y el resto de los contenedores, y se da por finalizado el contrato, el cual cambiará en la bandeja de contratos a la pestaña “contratos finalizados”. La siguiente imagen muestra una vista general del contenedor:

Término anticipado:	
Fecha	Causales
22 - 04 - 2017	☒ Incumplimientos administrativos ☐ Incumplimientos en la ejecución ☐ Situación del contratista ☐ Decisión del servicio ☐ De común acuerdo. ☐ Otras, especificar.
Guardar	

Fecha		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha en la que se aprueba el término anticipado de contrato.	Seleccionar la fecha desde el calendario de despliegue automático.	22/04/2017



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Causales		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Hecho o situación, contemplado previamente en las bases o demás documentos que rigen el contrato, que autoriza al servicio a poner término a un contrato en una fecha anterior a la contractual.	Seleccionar una o más opciones disponibles en la lista desplegable. En el caso que no coincida ninguna de las opciones, se debe seleccionar "Otras, especificar", en cuyo caso se desplegará un cuadro de texto en donde se expone la causal de término de contrato.	▪ Incumplimientos administrativos. ▪ Incumplimientos en la ejecución. ▪ Situación del contratista. ▪ Decisión del servicio. ▪ De común acuerdo. ▪ Otras, especificar.

7.2 Recepción de la obra

En este contenedor es posible registrar datos generales de las recepciones de la obra. En términos generales, este contenedor de registro consta de un contenedor para visualizar el Tipo de Recepción empleado para dar por culminada la obra y los datos esenciales asociados a ella.

7.2.1 Tipo de recepción

En este contenedor se registran las nuevas recepciones. El Tipo de recepción se puede definir mediante la combinación de selectores dispuestos en 2 Pasos, los que se detallan en la imagen a continuación:

Recepción De La Obra

Tipo De Recepción

Paso 1

☒ Total

☐ Parcial (Por Etapas)

Paso 2

☒ Única

☐ Provisoria



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Paso 1		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
En este paso se define, de forma permanente, si la obra será recepcionada considerando la totalidad de las partidas contempladas en el respectivo contrato (Total) o si se efectuarán múltiples recepciones parciales en función de etapas del proyecto (Parcial), las cuales podrán ser habilitadas para su uso o explotación de forma independiente.	Seleccionar una de las dos opciones de los botones de tipo radio.	▪ Total ▪ Parcial



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Paso 2		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
El selector dispuesto en este paso permite distinguir si la recepción a registrar corresponde a aquella que da por habilitada a la obra para su uso o explotación en un único acto, denominada “Recepción Única”; o si se trata de una “Recepción Provisoria”, la que se otorga con posterioridad a su habilitación, esto es, una vez que se cumplen los plazos contemplados en las garantías exigidas o aquellos establecidos en las respectivas Bases o Contrato. Las opciones “Provisoria” y “Única” se despliegan para las recepciones del Tipo Total seleccionada en el paso 1. No obstante, cuando se haya seleccionado el tipo de recepción Parcial en el paso 1, solo se desplegará la opción “Provisoria”.	Seleccionar una de las opciones de los botones de tipo radio, de acuerdo a la pregunta: ¿La recepción es definitiva o provisoria?	▪ Definitiva/Única ▪ Provisoria



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Paso 3		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Permite identificar si el registro de recepción corresponde a la última etapa de toda la obra en construcción. Esta opción solo se despliega a partir del segundo registro de recepción del tipo Parcial.	Seleccionar una de las dos opciones de los botones de tipo radio, de acuerdo a la pregunta: ¿La recepción seleccionada corresponde a la etapa final de la obra?	- Si - No

7.2.2 Recepción

Una vez seleccionado el Tipo de Recepción se deben completar datos esenciales dependiendo si en el Paso 1 se optó por una recepción del tipo Total o diversas recepciones del tipo Parcial Provisoria. El ingreso de una recepción definitiva, inhabilitará el resto de los contenedores de registro menos la liquidación, que aún puede ser ingresada.

7.2.2.1 Datos a completar para recepciones totales

Recepción De La Obra
Tipo De Recepción

☒ Total
☐ Única
☐ Parcial (Por Etapas)
☐ Provisoria

Fecha Recepción

Resultado

Fecha Recepción		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha del documento que da por culminada una parte o la totalidad de la obra, según sea al caso.	Se debe seleccionar la fecha desde el calendario de despliegue automático.	12/04/2016



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Resultado		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Esta opción permite indicar si la recepción ha sido otorgada con o sin observaciones por parte de la comisión de recepción o su equivalente.	Seleccionar una de las dos opciones de la lista desplegable. Por defecto, la opción "Sin Reservas" se encuentra pre-seleccionada.	- Sin Reservas - Con Reservas

7.2.2.2 Datos a completar para recepciones parciales provisionarias

En este sub contenedor se debe indicar el tipo de recepción de obra según el procedimiento de llenado que se ofrece a continuación. La siguiente imagen entrega una vista general del sub contenedor:

Recepción De La Obra
Tipo De Recepción

☐ Total
☐ Definitiva
☐ Etapa (s) que se recepciona (n)

☒ Parcial (Por Etapas)
☒ Provisoria

Fecha Recepción

Resultado

Etapa (s) que se recepciona (n)		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Indicación de la etapa a la que corresponde la presente recepción. Se sugiere utilizar dígitos para indicar el orden de etapamiento y la cantidad máxima de etapas contempladas durante la construcción de la obra.	Ingresar texto libre con un máximo de 50 caracteres.	1 de 4




POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Fecha de recepción		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha indicada en el acta de recepción, que da por culminada una parte o la totalidad de la obra, según sea al caso.	Seleccionar la fecha desde el calendario de despliegue automático.	16/05/2016

Resultado		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Esta opción permite indicar si la recepción ha sido otorgada con o sin observaciones por parte de la comisión de recepción o su equivalente.	Seleccionar una de las dos opciones de la lista desplegable. Por defecto, la opción "Sin Reservas" se encuentra pre-seleccionada.	▪ Sin Reservas ▪ Con Reservas

Los siguientes flujos muestran los procedimientos de registro de recepciones.


En caso de recepción total:

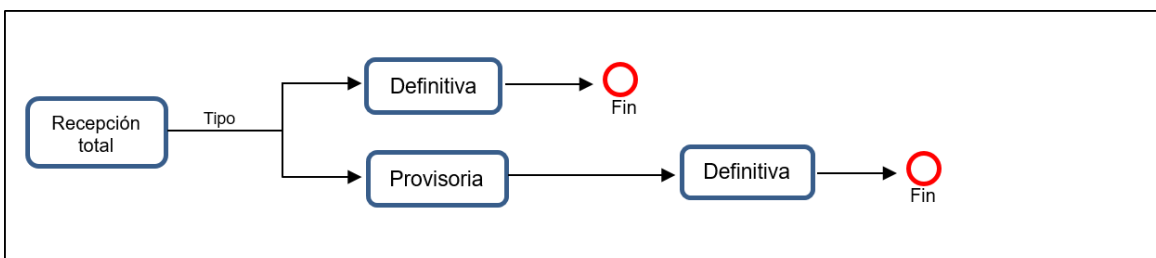



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

En caso de recepción parcial:

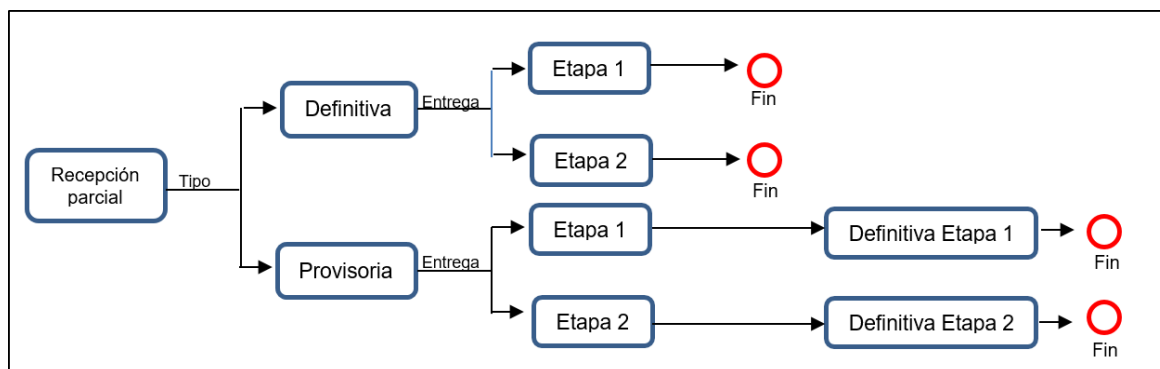

El ingreso de una recepción definitiva, inhabilitará el resto de los contenedores de registro menos la liquidación, que aún puede ser ingresada

7.3 Liquidación del contrato

En este contenedor se registran los datos de liquidación. Si el usuario quiere registrar la liquidación del contrato, deberá ingresar como campos obligatorios: fecha, saldo y monto de dicho saldo. Con esta etapa se da por finalizado un contrato con lo que el proyecto cambiará de pestaña en la bandeja de contratos a “contratos finalizados”. Los campos disponibles en este contenedor se detallan en la tabla posterior. La siguiente imagen entrega una visión general del contenedor:

Liquidación Del Contrato:	
Fecha	dd - mm - aaaa
Saldo	Seleccione una opción
Monto Del Saldo	
Monto Reajustes	
Valor Proforma	Seleccione una opción
Monto Proforma	
Guardar	

Fecha		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Fecha en que se aprueba la liquidación del contrato.	Seleccionar la fecha desde el calendario de despliegue automático.	22/03/2016



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Saldo		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Diferencia entre el monto total contemplado para la obra, incluidas todas las modificaciones, y el total pagado.	Seleccionar una de las cuatro opciones de la lista desplegable.	▪ A favor del fisco ▪ A favor del Contratista ▪ Saldo cero ▪ Saldo negativo

Monto del saldo		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra correspondiente al monto de la liquidación. Este campo solo se habilita cuando el "Saldo de liquidación" es distinto de "Saldo cero".	Ingresar un monto sin puntos ni decimales.	\$5.000.000.000

Monto reajustes		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra correspondiente a la suma final de los reajustes pagados durante el contrato según el respectivo sistema de actualización empleado.	Ingresar un monto sin puntos ni decimales. Si el contrato no considera reajustes ingresar "0"	\$23.000.000



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Valor proforma		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Campo que da cuenta de si hubo diferencias en alguna partida subcontratada entre el monto efectivamente pagado por el contratista debidamente acreditado para su reembolso, el cual puede diferir del monto contemplado al momento de contratar	Seleccionar una de las dos opciones de la lista desplegable.	▪ Aumento ▪ Disminución

Monto proforma		
Descripción	Procedimiento de llenado	Opciones / Ejemplo
Cifra en pesos chilenos correspondiente al monto efectivamente pagado por el contratista debidamente acreditado para su reembolso, el cual puede diferir del monto contemplado al momento de contratar	Ingresar un monto sin puntos ni decimales. En caso que el contrato haya considerado valores proforma, pero no se concretaron ni pagaron las actividades contempladas ingresar "0". Igualmente, corresponde anotar "0" en los casos que el contrato no considera valores proforma.	\$24.000.000

El registro de un término anticipado y una liquidación bloquearán automáticamente el resto de los contenedores de registro.

Sistema de Gestión de Obras - SISGEOB -

MANUAL PARA ENTIDADES PÚBLICAS Versión 2.0 – junio de 2021

Módulo de seguimiento



POR EL CUIDADO Y BUEN USO
DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
